PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Envejecer mejor

Tareas, tiempos, Matriz RACI y presupuesto

Integrantes: Ulysses Barreto, Maximiliano Miño, Fabián Solis, Valentina Guzmán y Lucas Erazo.

Objetivo del trabajo

Informar y generar conciencia sobre cómo llegar a la tercera edad de forma saludable, mostrando qué hábitos ayudan a prevenir las enfermedades y afecciones más comunes de la vejez. Para eso haremos afiches y folletos impresos, publicaciones en redes sociales y una página web informativa.

Fechas clave

Inicio del trabajo	miércoles 30 de septiembre
Presentación de avances	lunes 2 de noviembre
Término de las tareas	martes 17 de noviembre
Holgura (5 días)	18 al 22 de noviembre
Entrega del informe final y propuesta	lunes 23 de noviembre

Además, cada semana se mostrará un avance del trabajo.

Listado de tareas

N°	Tarea	Descripción
1	Definir el rango etario	Investigar en qué edades conviene enfocar el mensaje y elegir el grupo objetivo.
2	Investigar hábitos y enfermedades	Reunir información confiable sobre enfermedades de la vejez y los hábitos que ayudan a prevenirlas.
3	Definir mensajes y formato	Elegir las ideas principales que queremos transmitir y cómo se verán en cada material.
4	Diseñar afiches, folletos y publicaciones	Crear los 10 afiches y folletos impresos y las publicaciones para redes sociales.
5	Desarrollar la página web	Programar una página informativa con HTML, CSS y JavaScript.
6	Preparar la presentación de avances	Armar la presentación del 2 de noviembre.
7	Revisar contenidos y fuentes	Corregir errores y comprobar que la información esté bien respaldada.
8	Difundir el material	Repartir los afiches y folletos, publicar en redes y compartir la página web.
9	Redactar el informe final y la propuesta	Escribir el informe con los resultados del proyecto y la propuesta final.

Estimación de tiempo de cada tarea

Cada integrante puede dedicar entre 3 y 5 horas a la semana, es decir, el grupo cuenta con 15 a 25 horas semanales. Entre el 30 de septiembre y el 17 de noviembre son 7 semanas, lo que da entre 105 y 175 horas disponibles.

Tarea	Fechas	Días	Horas
1. Definir el rango etario	30 sep – 6 oct	7	2
2. Investigar hábitos y enfermedades	5 oct – 18 oct	14	15
3. Definir mensajes y formato	14 oct – 21 oct	8	5
4. Diseñar afiches, folletos y publicaciones	21 oct – 1 nov	12	6
5. Desarrollar la página web	21 oct – 10 nov	21	6
6. Preparar la presentación de avances	26 oct – 1 nov	7	4
7. Revisar contenidos y fuentes	3 nov – 10 nov	8	7
8. Difundir el material	4 nov – 15 nov	12	4
9. Redactar el informe final y la propuesta	5 nov – 17 nov	13	7
Total			**56 horas**

Las 56 horas quedan dentro de lo que el grupo puede dedicar. Algunas tareas se hacen en paralelo.

Matriz RACI


Cada tarea tiene una sola persona que responde por el resultado (A), que en algunos casos también es quien la ejecuta (A/R).

Tarea	Ulysses	Maximiliano	Fabián	Valentina	Lucas
1. Definir el rango etario	A/R	R	C	C	I
2. Investigar hábitos y enfermedades	C	A/R	R	C	I
3. Definir mensajes y formato	C	C	C	A/R	R
4. Diseñar afiches, folletos y publicaciones	I	C	R	R	A/R
5. Desarrollar la página web	C	A/R	R	I	C
6. Preparar la presentación de avances	A/R	R	C	R	C
7. Revisar contenidos y fuentes	R	R	A/R	C	C
8. Difundir el material	R	C	R	A/R	R
9. Redactar el informe final y la propuesta	R	R	C	C	A/R

R	Responsable: hace la tarea	A	Aprobador: responde por el resultado
C	Consultado: opina antes de decidir	I	Informado: se entera del avance

Carta Gantt

La Carta Gantt se encuentra en el archivo Excel adjunto (`carta_gantt.xlsx`), con las mismas tareas, fechas y responsables de este documento. El archivo de la Carta Gantt en Excel se encuentra en el Anexo.

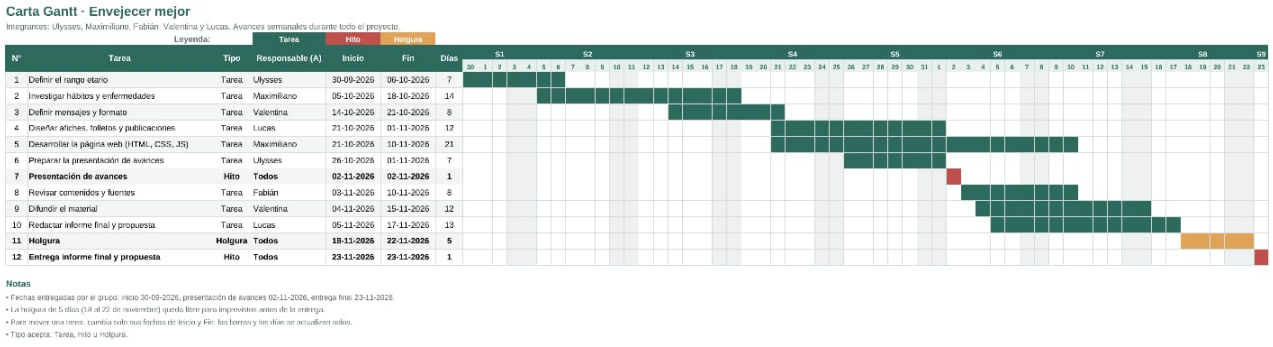

Carta Gantt · Envejecer mejor

Integrantes: Ulysses, Maximiliano, Fabián, Valentina y Lucas. Avances semanales durante todo el proyecto.

Leyenda: Tarea Hito Holgura

N°	Tarea	Tipo	Responsable (A)	Inicio	Fin	Días
1	Definir el rango etario	Tarea	Ulysses	30-09-2026	06-10-2026	7
2	Investigar hábitos y enfermedades	Tarea	Maximiliano	05-10-2026	18-10-2026	14
3	Definir mensajes y formato	Tarea	Valentina	14-10-2026	21-10-2026	8
4	Diseñar afiches, folletos y publicaciones	Tarea	Lucas	21-10-2026	01-11-2026	12
5	Desarrollar la página web (HTML, CSS, JS)	Tarea	Maximiliano	21-10-2026	10-11-2026	21
6	Preparar la presentación de avances	Tarea	Ulysses	26-10-2026	01-11-2026	7
7	**Presentación de avances**	Hito	**Todos**	**02-11-2026**	**02-11-2026**	1
8	Revisar contenidos y fuentes	Tarea	Fabián	03-11-2026	10-11-2026	8
9	Difundir el material	Tarea	Valentina	04-11-2026	15-11-2026	12
10	Redactar informe final y propuesta	Tarea	Lucas	05-11-2026	17-11-2026	13
11	**Holgura**	Holgura	**Todos**	**18-11-2026**	**22-11-2026**	5
12	**Entrega informe final y propuesta**	Hito	**Todos**	**23-11-2026**	**23-11-2026**	1

Notas

- Fechas entregadas por el grupo: inicio 30-09-2026, presentación de avances 02-11-2026, entrega final 23-11-2026.
- La holgura de 5 días (18 al 22 de noviembre) queda libre para imprevistos antes de la entrega.
- Para mover una tarea, cambia solo sus fechas de Inicio y Fin: las barras y los días se actualizan solos.
- Tipo acepta: Tarea, Hito u Holgura.

Presupuesto

El presupuesto se expresa en horas de trabajo del equipo, no en dinero. La estimación considera el esfuerzo necesario para completar cada tarea; no se asignan tarifas, costos de materiales ni montos monetarios.

Tarea	Esfuerzo (horas)
1. Definir el rango etario	2
2. Investigar hábitos y enfermedades	15
3. Definir mensajes y formato	5
4. Diseñar afiches, folletos y publicaciones	6
5. Desarrollar la página web	6
6. Preparar la presentación de avances	4
7. Revisar contenidos y fuentes	7
8. Difundir el material	4
9. Redactar el informe final y la propuesta	7
Total de esfuerzo estimado	**56 horas**

El total corresponde a horas de esfuerzo del equipo. No representa un gasto ni un monto que deban aportar los integrantes.

Anexo: Carta Gantt

Archivo original en Excel: **carta_gantt.xlsx** (haz clic para abrirlo).
